

LEYENDAS		
DESvíOS DE TRÁFICO	SEÑALES DESvíOS DE TRÁFICO	BALIZAS Y VALLAS
<p>--- CONTORNO PARKING PLANTA CUBIERTA</p> <p> CERRAMIENTO DEL ÁMBITO DE OBRA EN SUPERFICIE</p> <p> UBICACIÓN DE CASETAS DE OBRA Y DEPÓSITO DE MATERIALES</p> <p>--- DIRECCIÓN Y SENTIDO HABITUAL DEL TRÁFICO</p> <p>--- DESvíO DE TRÁFICO PROPUESTO DURANTE LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIÓN DE LA PLAZA DE LA LUNA Y NUEVO NÚCLEO DE ESCALERAS</p> <p> BARRERA NEW JERSEY CORTE Y DESvíO DE CALLES</p>	<p>DIRECCIÓN OBLIGATORIA</p> <p>R-400a  R-400b  R-400c  R-400d </p> <p>ZONA DE OBRAS  DESvíO  RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD  R-301</p> <p>A-16  TS-210 </p>	<p> BALIZAS LUMINOSAS</p> <p> VALLA DIRECCIONAL REFLEXIVA</p> <p> VALLA DIRECCIONAL</p> <p> VALLA REFLEXIVA</p>



NOTA:

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PENDIENTES DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN Y SISTEMA DE DRENAJE SERÁ NECESARIO RETIRAR TODO EL MOBILIARIO URBANO, RETIRAR EL PAVIMENTO Y EXCAVAR HASTA COTA DE CUBIERTA PARA REALIZAR LAS OBRAS. ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ EN 2 FASES DEL 50% APROX. DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA PUDIENDO ASÍ DESTINAR ÁREAS DE ACOPIO DE MATERIALES Y DEPÓSITO DE RESIDUOS EN SUPERFICIE Y, NO SOLAPAR LOS DESVÍOS DE TRÁNSITO QUE SERÁN NECESARIOS EN AMBOS EXTREMOS DE LA PLAZA DE SANTA ANA.

FASE 1:

ACOPIO DE MATERIALES Y CONTENEDORES DE RESIDUOS: SE DESTINA UN ÁREA JUNTO A LA RAMPA DE SALIDA DEL PARKING. LOS CAMIONES ACCEDERÁN POR CALLE PRÍNCIPE, GIRAN EN PLAZA DE STA ANA, DESCARGAN MATERIAL O CARGAN RESIDUOS Y SALEN POR CALLE DE NUÑEZ DE ARCE. LA PROXIMIDAD A LA RAMPA PERMITE LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DE LAS OBRAS DEL INTERIOR DEL PARKING.

DESVÍOS DE TRÁNSITO: SERÁ NECESARIO DESVIAR LIGERAMENTE LA CALLE PRÍNCIPE PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE CUBIERTA QUE ESTÁ DEBAJO DE LA CALZADA. SE PROPONE DESVÍO POR SOBRE LA ACERA EXISTENTE, REDUCIENDO SU ANCHO DURANTE ESTA FASE.

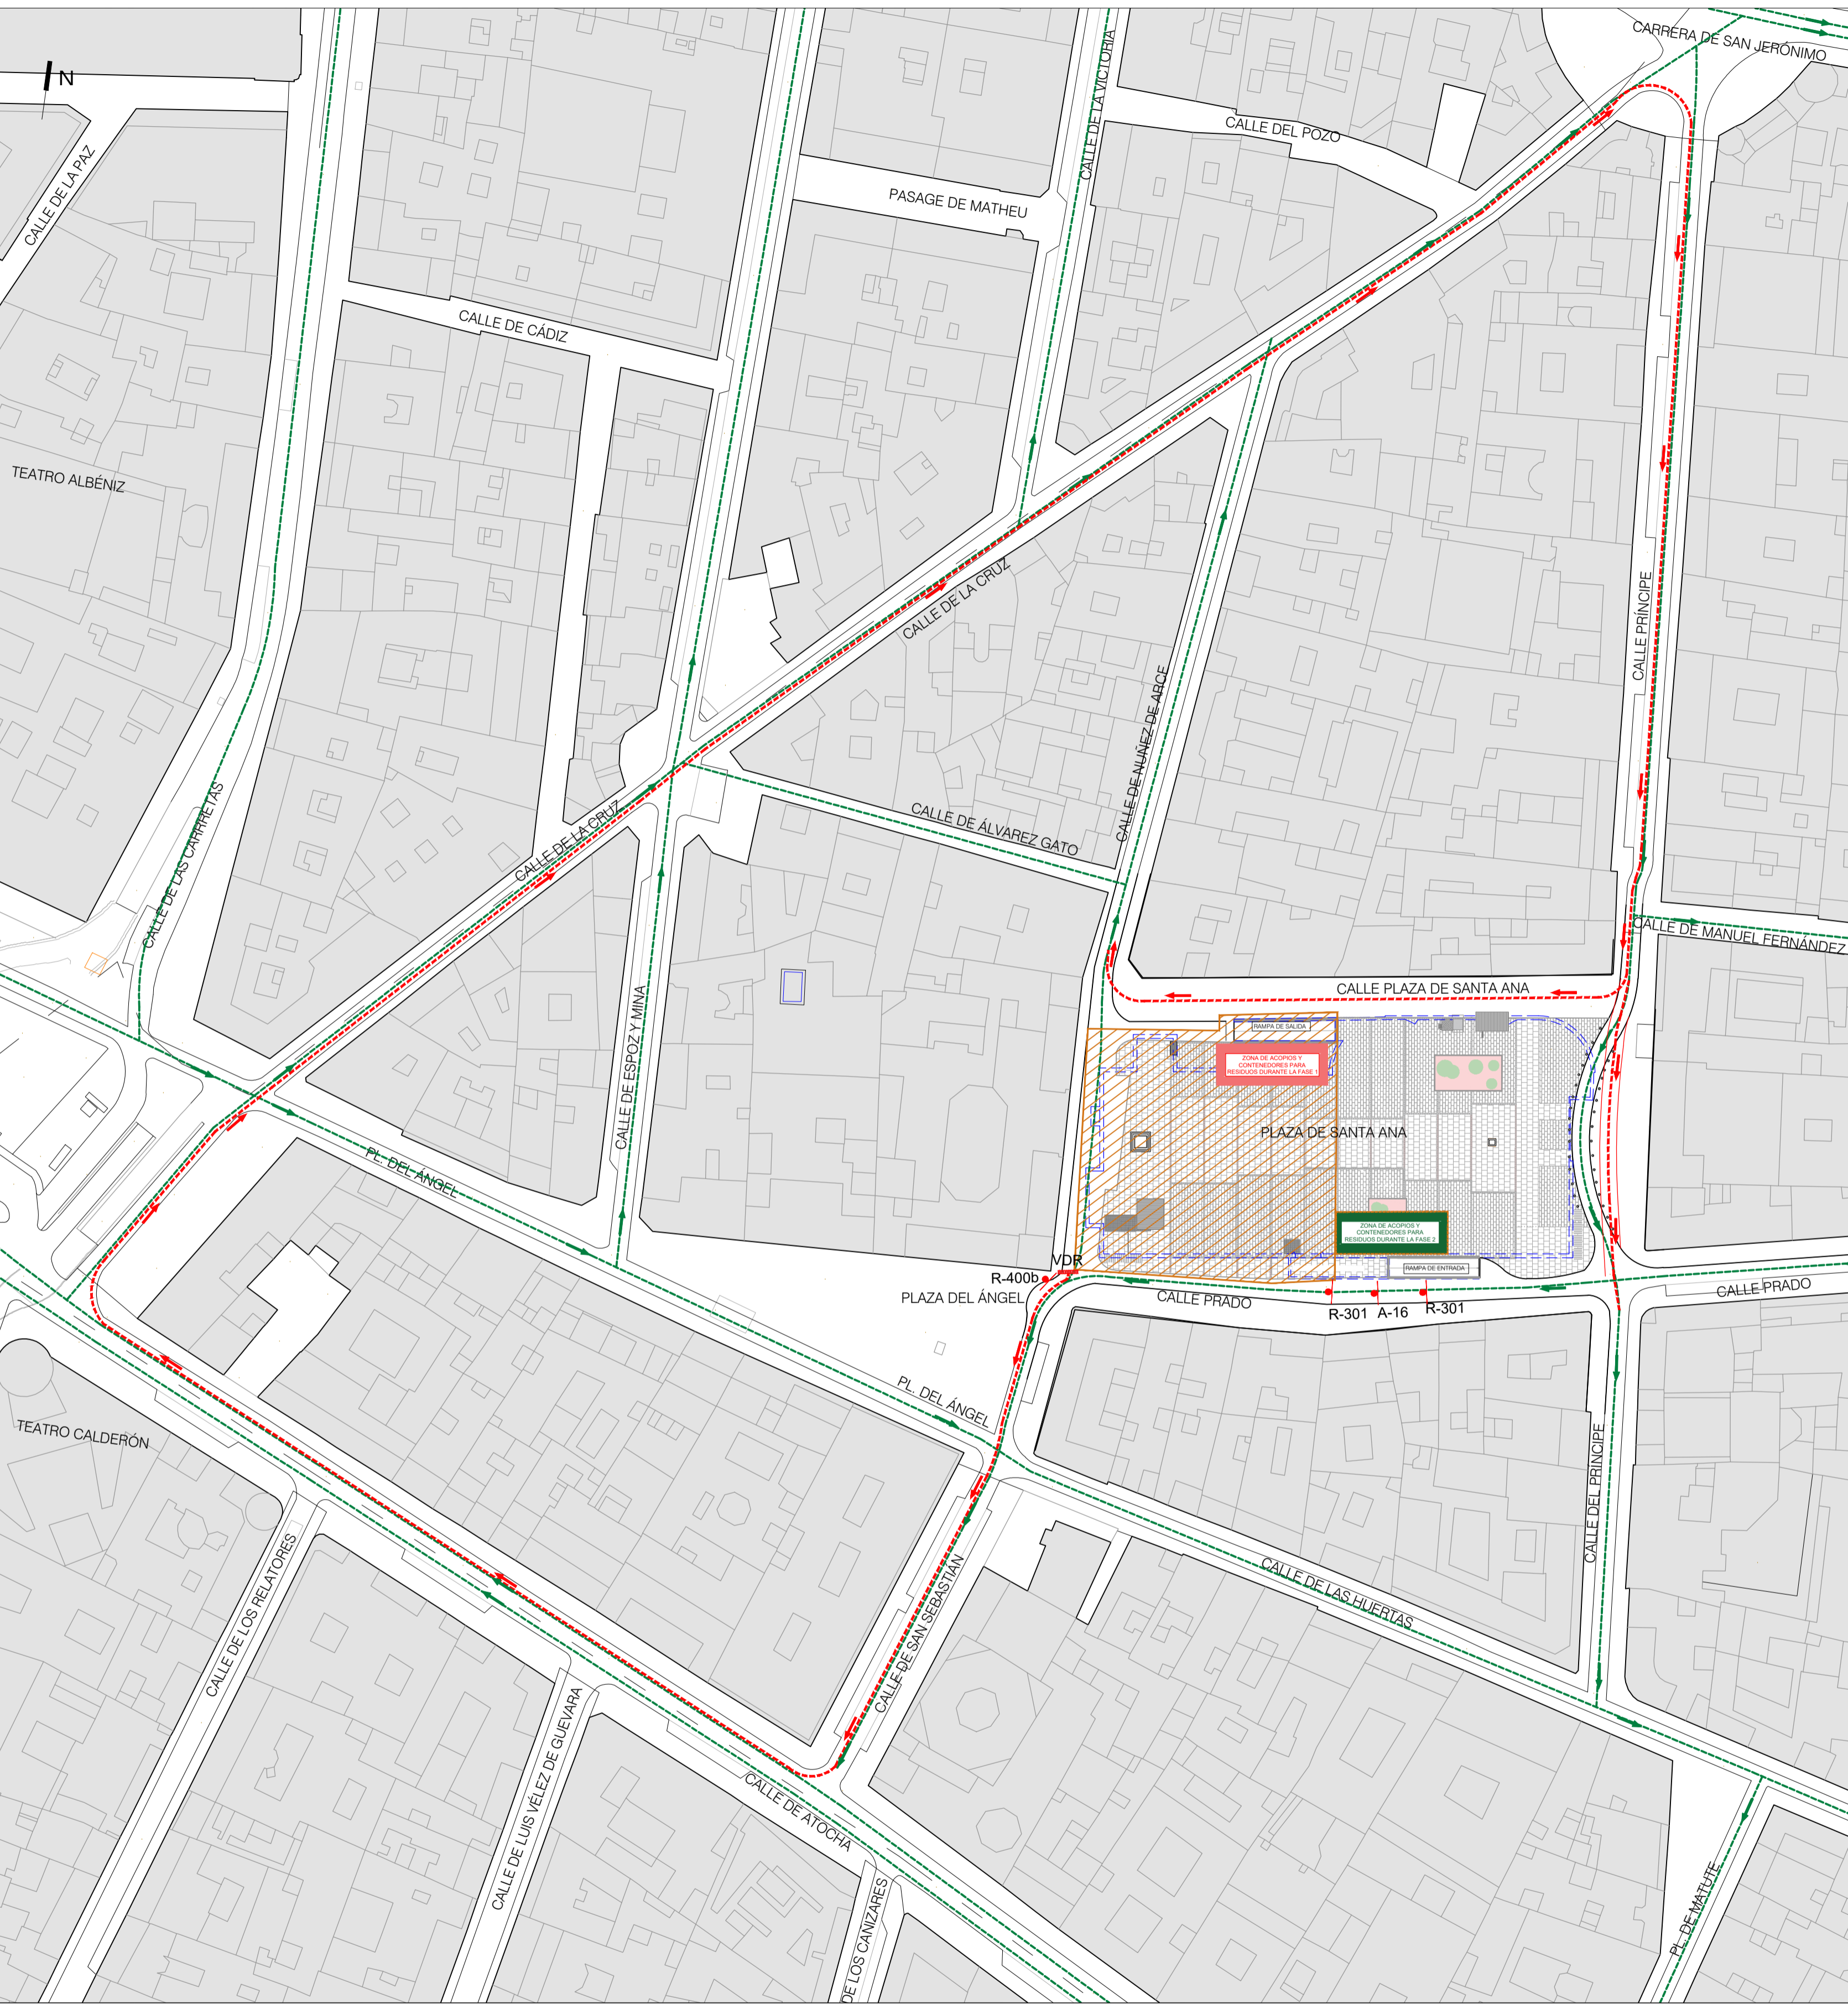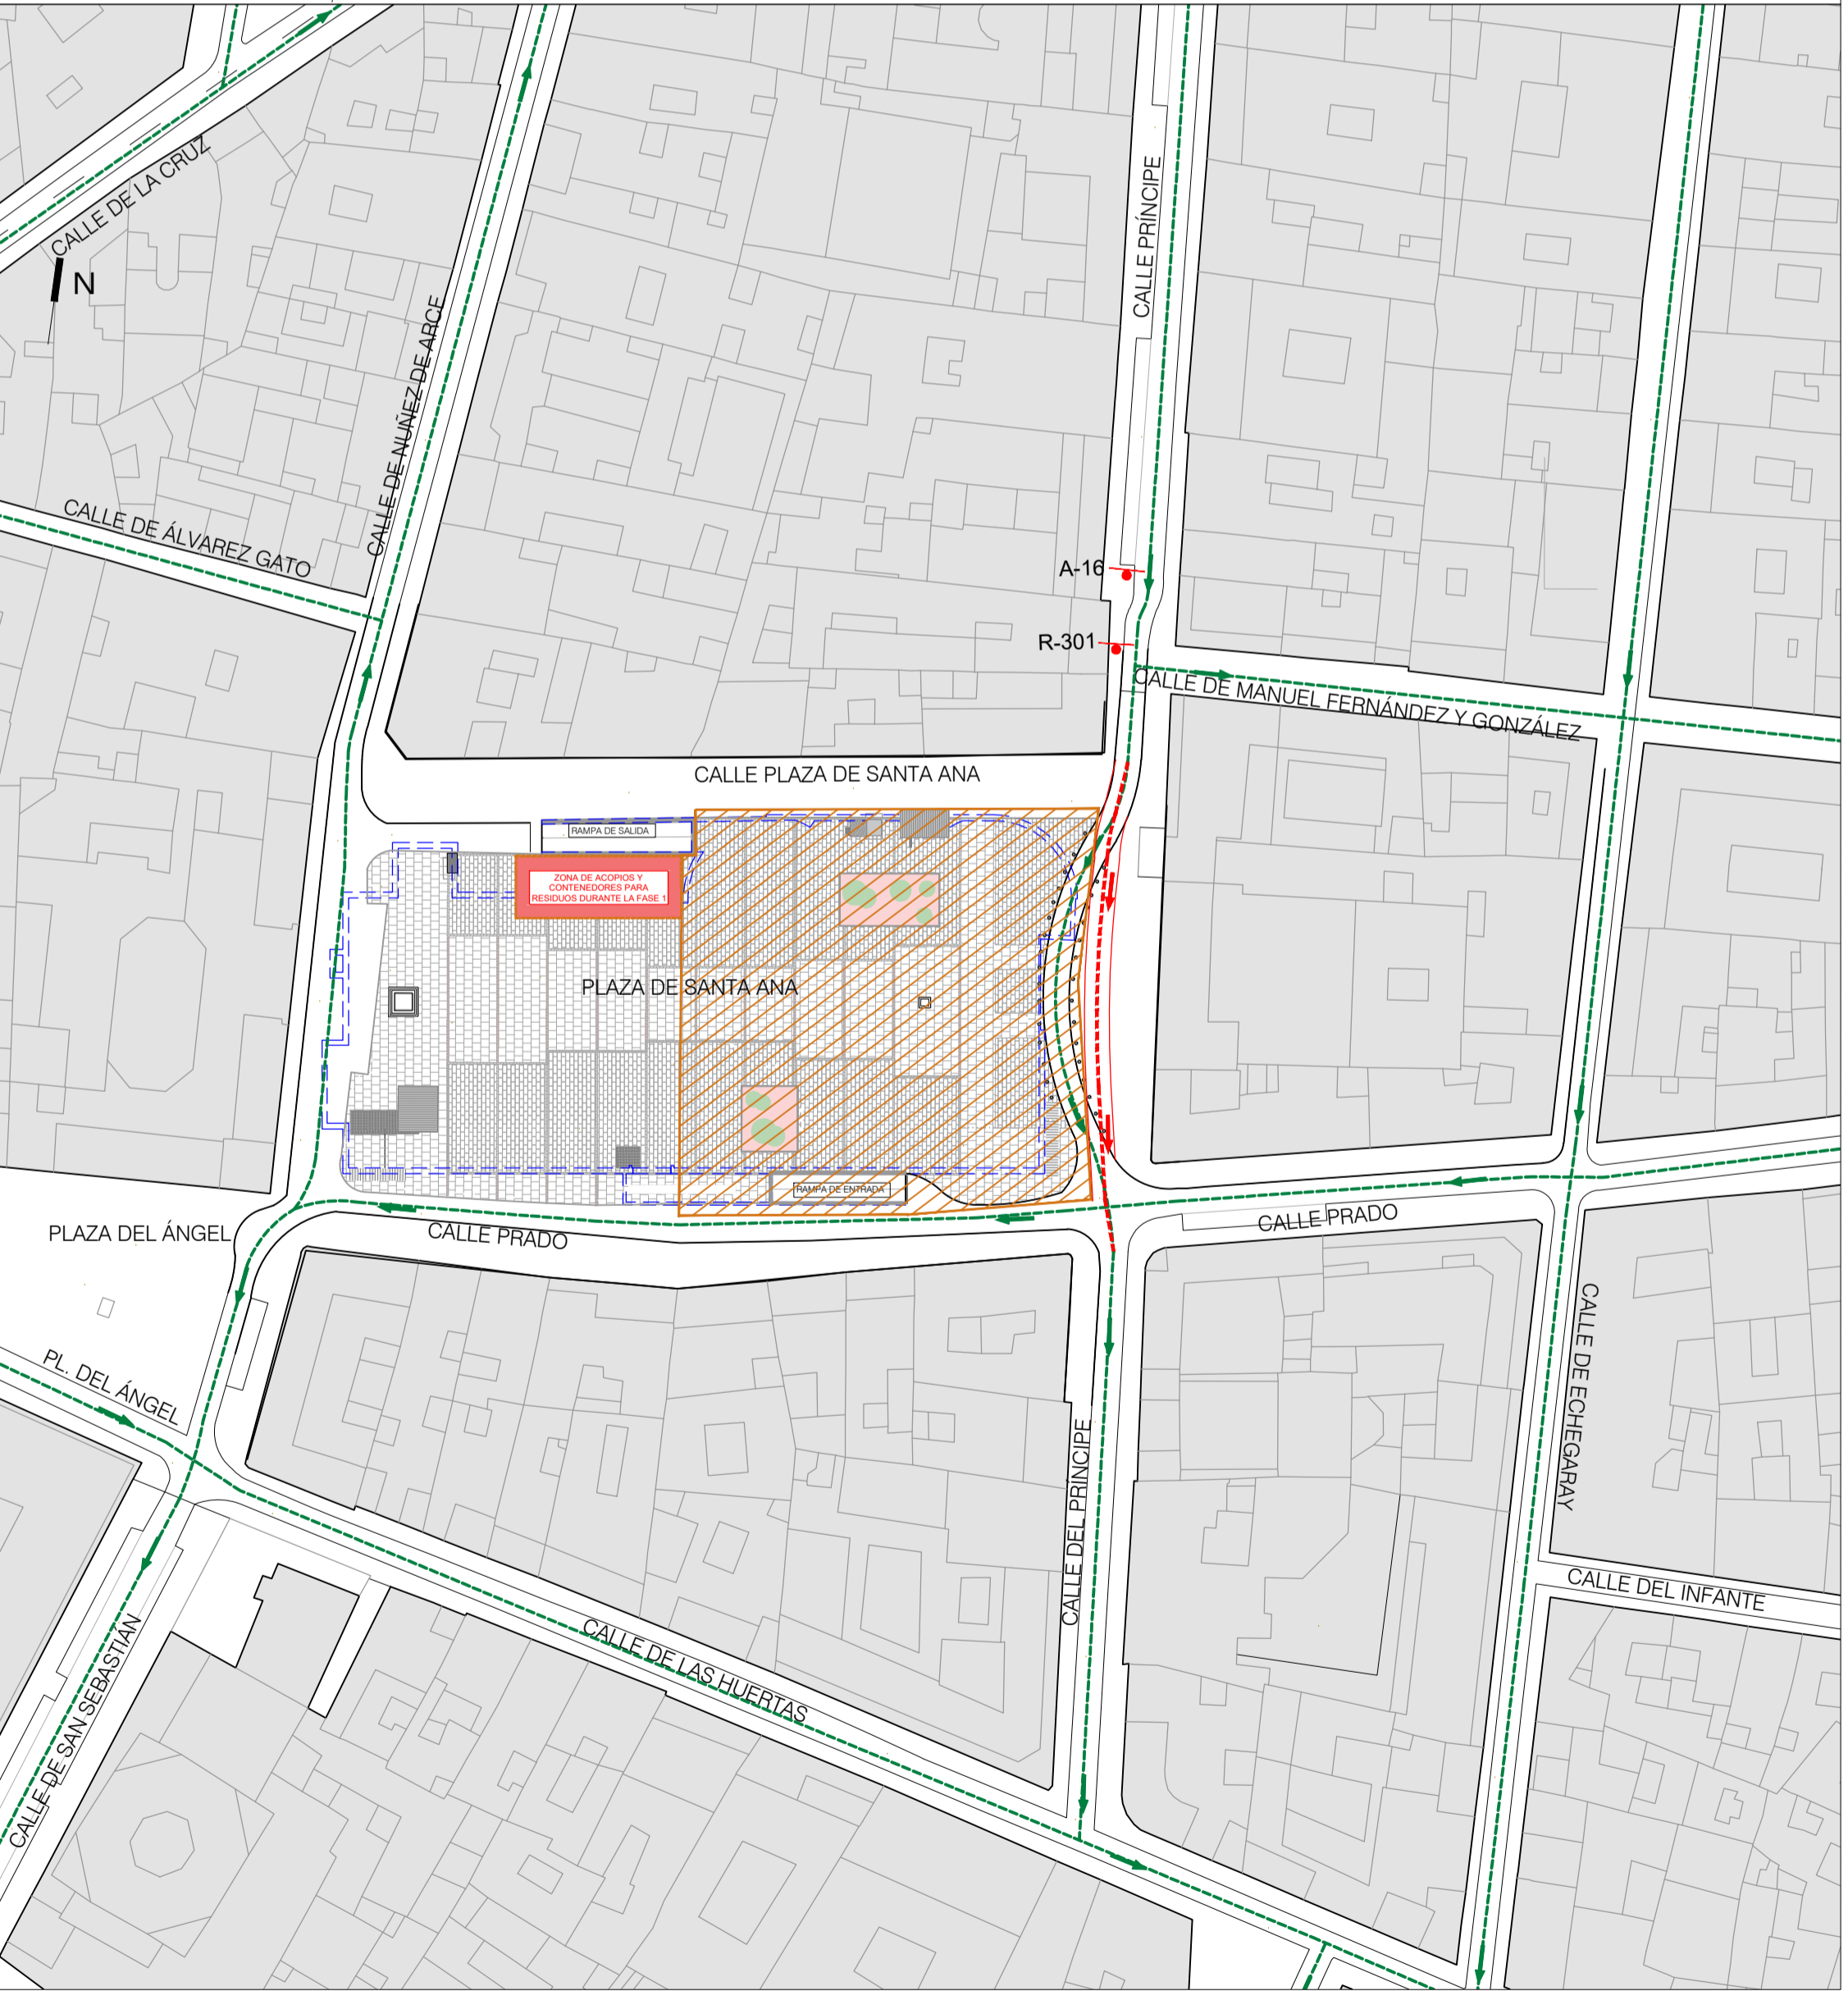

FASE 2:

ACOPIO DE MATERIALES Y CONTENEDORES DE RESIDUOS: SE DESTINA UN ÁREA JUNTO A LA RAMPA DE ENTRADA DEL PARKING. LOS CAMIONES ACCEDERÁN POR CALLE PRÍNCIPE, GIRAN EN CALLE PRADO, DESCARGAN MATERIAL O CARGAN RESIDUOS Y SALEN POR CALLE PL DEL ÁNGEL. LA PROXIMIDAD A LA RAMPA PERMITE LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DE LAS OBRAS DEL INTERIOR DEL PARKING.

DESvíOS DE TRÁNSITO:SEÁ NECESARIO INTERRUPIR EL TRÁNSITO EN CALLE PLAZA DE STA ANA EN SU PROLONGACIÓN CON CALLE DE PL. DEL ÁNGEL. ESTA INTERRUPCIÓN AFECTA ÚNICAMENTE A QUIENES TENGAN COMO DESTINO CALLE NUÑEZ DE ARCE PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE CUBIERTA QUE ESTÁ DEBAJO DE LA CALZADA. SE PROPONE DESvíO HASTA TOMAR CALLE ATOCHA Y GIRAR EN CALLE DE LA CRUZ Y ASÍ PODER ACCEDER DESDE EL NORTE HACIA LA PLAZA.
